



ZAVOD ZA PLANIRANJE RAZVOJA
KANTONA SARAJEVO

**IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI PROJEKATA IZ PROGRAMA JAVNIH
INVESTICIJA KANTONA SARAJEVO 2019-2021. NA DAN 31.12.2018. GODINE**

Direktor:

Hamdija Efendić, dipl.ing.građ.

Sarajevo, mart/ožujak 2019. godine

ZAVOD ZA PLANIRANJE RAZVOJA KANTONA SARAJEVO

www.zavodzpr-sa.ba

Direktor:

Hamdija Efendić, dipl.ing.grad.

Koordinacija i obrada:

SEKTOR ZA PLANIRANJE DRUŠTVENO-EKONOMSKOG RAZVOJA

e-mail: ecc_sektor@zavodzpr-sa.ba

Pomoćnik direktora za planiranje društveno ekonomskog razvoja:

mr.sc. Maida Fetahagić

Šef službe za upravljanje projektima KS:

Ermina Čatić, dipl. ecc.

Šef službe za istraživanje i razvoj:

Emina Kašmo, dipl.ecc.

Priprema i obrada:

Ermina Čatić, dipl.ecc.

Feriha Uzunović, dipl.ecc.

Edin Trgo, ee

Sadržaj

Uvod 3

1. Projekti u implementaciji iz PJI KS 2019.-2021 sa realizacijom 31.12.2018. godine 4

2. Projekti prema strukturi i načinu finansiranja..... 12

Zaključak..... 13

Uvod

Zaključkom Vlade Kantona Sarajevo broj 02-05-35664-15/18 zadužuje se Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo da u saradnji sa resornim ministarstvima Kantona Sarajevo pripremi „Izveštaj o realizaciji projekata iz Programa javnih investicija Kantona Sarajevo 2019-2021. na dan 31.12.2018. godine“(u daljem tekstu Izveštaj).

Cilj Izveštaja je informisati Vladu Kantona Sarajevo o realizaciji projekata iz Programa javnih investicija KS.

Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo u saradnji sa resornim ministarstvima Kantona Sarajevo i općinama pripremio je izvještaj o realizaciji sa presjekom 31.12.2018. godine.

U više navrata Zavod je upućivao urgencije za dostavu podataka.

Sva ministarstva su dostavila projekte u implementacije sa realizacijom 31.12.2018. godine, a zadnji projekti su dostavljeni 21.03.2019. godine.

Izveštaj daje presjek realizacije projekata u implementaciji zaključno sa 31.12.2018. godine kao i realizaciju za cijeli investicioni period.

Izveštaj se sastoji iz dva djela:

1. Projekti u implementaciji sa realizacijom 31.12.2018. godine,
2. Projekti prema strukturi i načinu finansiranja.

1. Projekti u implementaciji iz PJI KS 2019.-2021 sa realizacijom 31.12.2018. godine

U Izvještaju su uključeni projekti koji su u implementaciji i čija realizacija je počela prije 2018 godine i projekti čija se realizacija nastavlja. Ukupna vrijednost svih projekata u implementaciji po ministarstvima kojih ima 66, iznosi 644.664.730 KM, a po općinama kojih ima 7, iznosi 31.476.095 KM.

Od vrijednosti projekata u implementaciji po ministarstvima 644.664.730 KM u investicionom periodu realizovano je 244.653.923 KM ili 38,0%, a od vrijednosti projekata u implementaciji po općinama 31.476.095 KM u investicionom periodu realizovano je 12.017.630 KM ili 38,2%. Od ukupne vrijednosti projekata u implementaciji po ministarstvima planirano je za 2018. godinu 142.454.925 KM, od čega je na dan 31.12.2018. godine realizovano 62.534.683 KM ili 43,9%, dok je u općinama za 2018. godinu planirano 10.980.237 KM, od čega je na dan 31.12.2018. godine realizovano 8.980.237 KM ili 81,8 %.

Za nastavak realizacije projekata u implementaciji po ministarstvima u 2019. godini potrebno je obezbjediti ukupno 78.027.548 KM, dok je po općinama potrebno obezbjediti 9.758.341 KM.

U narednim tabelama daje se pregled svih projekata (u implementaciji) sa stepenom ukupne realizacije (u investicionom periodu) i stepenom realizacije u prvoj polovini 2018. godine.

Tabela 1. Pregled projekata u implementaciji po ministarstvima, u KM

Podnositelj	R.b	Naziv projekta	Ukupna vrijednost	Utrošeno u prethodnim godinama	Plan za tekuću godinu	Realizovano od 01.01.-31.12.2018.	Ukupno realizovano	Stepen ukupne realizacije u %	Stepen ukupne realizacije u 2018 u %	Nedostajuća sredstva	Plan			Naredni period
											2019	2020	2021	
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade	1	Projekat energetske efikasnosti u osnovnim i srednjim školama	1.116.148		130.000	130.000	130.000	11,6	100,0		986.148			
	2	Izgradnja osnovne škole u naselju Aneks	6.444.960	3.173.817	3.271.143	3.271.143	6.444.960	100,0	100,0					
	3	Sufinansiranje izgradnje sale za tjelesni odgoj u JU OŠ "Dobroševići"	1.380.000	800.000	580.000	580.000	1.380.000	100,0	100,0					
	4	Sufinansiranje izgradnje sale za tjelesni odgoj u JU OŠ "Hašim Spahić"	750.000	200.000	550.000	550.000	750.000	100,0	100,0					
	5	Sufinansiranje izgradnje sale za tjelesni odgoj u JU OŠ "Sedma osnovna škola"	1.030.000	730.000	300.000	300.000	1.030.000	100,0	100,0					
	6	Sufinansiranje izgradnje JU OŠ "Zaim Kolar"-škola u prirodi, Šabići	1.530.000	700.000	530.000	530.000	1.230.000	80,4	100,0		300.000			
	7	Izgradnja osnovne škole u MZ Stup	3.370.000		100.000						1.270.000		1.000.000	1.000.000

Podnositelj	R.b	Naziv projekta	Ukupna vrijednost	Utrošeno u prethodnim godinama	Plan za tekuću godinu	Realizovano od 01.01.-31.12.2018.	Ukupno realizovano	Stepen ukupne realizacije u %	Stepen ukupne realizacije u 2018 u %	Nedostajuća sredstva	Plan			Naredni period
											2019	2020	2021	
	8	Nabavka opreme za realizaciju Projekata "Elektronski dnevnik"	4.400.000		1.100.000	1.100.000	1.100.000	25,0	100,0	303.000	999.000	999.000	999.000	
	9	Sufinansiranje izgradnje i opremanja sale za tjelesni odgoj u JU SC "Neždad Ibrišimović" Ilijaš	1.050.000		650.000	650.000	650.000	61,9	100,0		400.000			
	10	Izgradnja Univerzitetske biblioteke	39.851.405	1.072.116	430.468	430.468	1.502.584	3,8	100,0	35.348.821	1.500.000	1.500.000		
	11	Izgradnja Akademije scenskih umjetnosti-II faza	2.499.000	1.462.874	206.645	206.645	1.669.519	66,8	100,0		829.481			
	12	Rekonstrukcija bazena na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu	3.236.000	2.300.000	836.000	836.000	3.136.000	96,9	100,0		100.000			
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade			66.387.513	10.438.807	8.514.256	8.414.256	19.023.063	28,7	98,8	36.921.821	5.114.629	3.499.000	1.999.000	
Ministarstvo zdravstva KS	1	Rekonstrukcija objekta Zavoda za hitnu medicinsku pomoć KS i specifikacija potrebne opreme	2.729.963		260.000	259.572	259.572	9,5	99,8		660.000	300.000	600.000	909.963
	2	Izgradnja i opremanje zgrade Odjeljenja za forenzičku psihijatriju pri JU Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo	6.215.000								3.000.000	1.500.000	1.715.000	
	3	Rekonstrukcija doma zdravlja Kumrovec	7.576.831	6.424.221	1.152.610	1.152.610	7.576.831	100,0	100,0					
	4	Izgradnja prostora u CMB_u za smještaj kardiohirurgije, izgradnja terapijskog dijela nuklearne medicine, etaža 04 CMB-a, Izgradnja op bloka sa intenzivnom njegom, etaža 06 i 07 CMB-a, izgradnja oftamološke klinike i klinike za plastičnu hirurgiju na etažama 14 i 15 CMB-a	25.454.169	25.043.462	410.707	410.707	25.454.169	100,0	100,0					
	5	"Energetska - efikasnost" - objekat "Neuro-psihijatrije"	1.163.028	124.289	1.038.739	1.038.739	1.163.028	100,0	100,0					
	6	Zanavljanje dotrajale medicinske i	4.557.000	1.522.736	1.984.264	1.899.874	3.422.610	75,1	95,7		400.000	200.000	450.000	

Podnositelj	R.b	Naziv projekta	Ukupna vrijednost	Utrošeno u prethodnim godinama	Plan za tekuću godinu	Realizovano od 01.01.-31.12.2018.	Ukupno realizovano	Stepen ukupne realizacije u %	Stepen ukupne realizacije u 2018 u %	Nedostajuća sredstva	Plan			Naredni period
											2019	2020	2021	
		nemedicinske opreme u JU Dom zdravlja KS												
	7	Adaptacija i renoviranje objekata OII za smještaj odjela Pedijatrije u prizemlju J.U. Opća Bolnica "Prim.dr. Abdulah Nakaš"	2.100.000		300.000	300.000	300.000	14,3	100,0		1.800.000			
	8	Nabavka medicinske opreme za potrebe Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu	4.166.000		1.366.000	1.366.000	1.366.000	32,8	100,0		1.000.000	800.000	1.000.000	
	9	Nabavka medicinske i nemedicinske opreme za potrebe J.U. Opća Bolnica "Prim.dr. Abdulah Nakaš"	5.100.000	2.700.000	1.000.000	1.000.000	3.700.000	72,5	100,0			700.000	700.000	
Ministarstvo zdravstva KS			59.061.991	35.814.708	7.512.320	7.427.502	43.242.210	73,2	98,9		6.860.000	3.500.000	4.465.000	909.963
Ministarstvo privrede	1	Projekat opremanja prihvatilišta pasa lualica	1.000.000		50.000	50.000	50.000	5,0	100,0		950.000			
	2	Nabavka ledene plohe	1.200.000		540.905	540.905	540.905	45,1	100,0		659.095			
	3	Proizvodnja i primjena novih energenata	4.000.000		1.500.000						1.500.000	1.000.000		
	4	Provođenje šumsko-uzgojnih radova i radova na zaštiti šuma na području Kantona Sarajevo za 2018. godinu - kapitalni projekti iz šumarstva	14.015.061	5.940.000	475.061	475.061	6.415.061	45,8	100,0		2.600.000	2.500.000	2.500.000	
	5	Sanacija piste za brzo klizanje na Zetri	7.347.000	2.497.000	350.000	350.000	2.847.000	38,8	100,0		1.000.000	1.500.000	2.000.000	
	6	Izgradnja sistema za vještačku proizvodnju snijega i novi vertikalni transport na Bjelašnici	18.578.430	18.578.430			18.578.430	100,0	#DIV/0!					
	7	Nabavka Ratrak-mšina za uređenje skijaških staza	1.499.991	612.534	887.457	584.766	1.197.300	79,8	65,9					
	8	Rekonstrukcija startnog objekta na vrhu Bjelašnice	2.200.000		1.500.000						700.000			
	9	Infrastrukturno uređenje i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa u industrijskim zonama Kantona Sarajevo	13.084.200		1.930.800	1.930.800	1.930.800	14,8	100,0		3.640.000	3.756.700	3.756.700	11.284.200
Ministarstvo privrede			62.924.682	27.627.964	7.234.223	3.931.532	31.559.496	50,2	54,3		11.049.095	8.756.700	8.256.700	11.284.200

Podnositelj	R.b	Naziv projekta	Ukupna vrijednost	Utrošeno u prethodnim godinama	Plan za tekuću godinu	Realizovano od 01.01.-31.12.2018.	Ukupno realizovano	Stepen ukupne realizacije u %	Stepen ukupne realizacije u 2018 u %	Nedostajuća sredstva	Plan			Naredni period
											2019	2020	2021	
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša	1	Implementacija Plana upravljanja otpadom Kantona Sarajevo	11.717.763	6.358.775	2.508.988	2.508.988	8.867.763	75,7	100,0		1.850.000	1.000.000		
	2	Predinvestiranje u rješavanju imovinsko pravnih odnosa i izgradnji primarne materijalne infrastrukture za pokretanje individualne i kolektivne stambene izgradnje u skladu sa prostorno planskom dokumentacijom na području KS	18.440.748	14.062.588	3.478.160		14.062.588	76,3			300.000	300.000	300.000	
	3	Realizacija projekata povećanja energetske efikasnosti objekata budžetskih korisnika kantona	7.960.049	3.243.779	1.716.270	1.490.574	4.734.353	59,5	86,8		1.000.000	1.000.000	1.000.000	
	4	Povećanje energetske efikasnosti u stambenim zgradama Kantona Sarajevo	10.049.257	5.987.249	1.962.008	1.894.408	7.881.657	78,4	96,6	700.000	700.000	700.000		
	5	Sanacija ratnim dejstvima oštećenih krovova	12.990.755	12.740.755	100.000	100.000	12.840.755	98,8	100,0		50.000	50.000	50.000	
	6	Sredstva za sanaciju ratnim dejstvima oštećenih liftova	3.043.429	2.749.065	114.364	114.364	2.863.429	94,1	100,0		60.000	60.000	60.000	
	7	Unapređenje sistema monitoringa kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo	1.149.169	167.641	181.528	181.528	349.169	30,4	100,0	632.359		200.000	200.000	400.000
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša			65.351.170	45.309.852	10.061.318	6.289.862	51.599.714	79,0	62,5	1.332.359	3.960.000	3.310.000	1.610.000	400.000
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture	1	Interventni program 2016 (realizacija po Općinama KS)	7.200.000		3.600.000	1.530.000	1.530.000	21,3	42,5	3.600.000				
	2	Studija za smanjenje neprihodovane vode u KS	2.000.000		1.000.000					1.000.000				
	3	Sanacija prioriternih dijelova vodovodnog sistema- I tranša kredita EBRD	40.000.000		20.000.000						10.000.000	10.000.000		
	4	Rekonstrukcija postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda Butila	50.130.000		6.960.000	6.960.000	6.960.000	13,9	100,0	43.170.000				

Podnositelj	R.b	Naziv projekta	Ukupna vrijednost	Utrošeno u prethodnim godinama	Plan za tekuću godinu	Realizovano od 01.01.-31.12.2018.	Ukupno realizovano	Stepen ukupne realizacije u %	Stepen ukupne realizacije u 2018 u %	Nedostajuća sredstva	Plan			Naredni period
											2019	2020	2021	
	5	Izgradnja Kotlovnice snagee 20 MW na kkalitetu obuhvata regulacionog plana "Allipašin most VII" (kotlovnica Alipašin most-1)	4.485.472		4.485.472	4.485.472	4.485.472	100,0	100,0					
	6	Javna punionica vozila na komprimirani prirodni gas (CNG)	1.800.000		1.200.000	1.200.000	1.200.000	66,7	100,0			300.000	300.000	
	7	Subvecioniranje troškova rekonstrukcije unutrašnjih gasnih instalacija	1.901.000		501.000	441.386	441.386	23,2	88,1		400.000	500.000	500.000	
	8	Projekat riciklažnog dvorišta u okviru Regionalnog centra za upravljanje otpadom Smiljevići	1.005.294		1.005.294	1.005.294	1.005.294	100,0	100,0					
	9	Povećanje kapaciteta za ukop/sahranu na groblju "Vlakovo"-proširenje groblja "Vlakovo"	5.106.900	188.380	6.900	6.900	195.280	3,8	100,0		800.000	1.650.000	2.650.000	
	10	Unapredjenje deponovanja komunalnog otpada u okviru RCUO-Smiljevići	577.000		577.000	577.000	577.000	100,0	100,0					
	11	Povećanje kapaciteta za ukop/sahranu na groblju "Vlakovo"-kompleks krematorija i komemorativnog centra Sarajevo	1.582.656		57.911	57.911	57.911	3,7	100,0		1.224.745	150.000	150.000	
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture			115.788.322	188.380	39.393.577	16.263.963	16.452.343	14,2	41,3	47.770.000	12.424.745	12.600.000	3.600.000	
Ministarstvo unutrašnjih poslova	1	Nabavka opreme	47.205.799	29.296.823	6.183.555	6.183.555	35.480.378	75,2	100,0	113.245	8.932.176	1.490.000	1.190.000	
	2	Dogradnja i adaptacija IV plicijske uprave MUP-a KS, PS Novi Grad	1.582.656		400.000						600.000			
Ministarstvo unutrašnjih poslova			48.788.455	29.296.823	6.583.555	6.183.555	35.480.378	72,7	93,9	113.245	9.532.176	1.490.000	1.190.000	
Ministarsvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice	1	Izgradnja objekta KJU " Porodično savjetovalište"	2.685.631	1.015.021	1.490.000	788.440	1.803.461	67,2	52,9	130.610	50.000			
Ministarsvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice			2.685.631	1.015.021	1.490.000	788.440	1.803.461	67,2	52,9	130.610	50.000			

Podnositelj	R.b	Naziv projekta	Ukupna vrijednost	Utrošeno u prethodnim godinama	Plan za tekuću godinu	Realizovano od 01.01.-31.12.2018.	Ukupno realizovano	Stepen ukupne realizacije u %	Stepen ukupne realizacije u 2018 u %	Nedostajuća sredstva	Plan			Naredni period	
											2019	2020	2021		
Ministartvo saobraćaja - Direkcija za ceste KS	1	Izgradnja i rekonstrukcija I transverzale-Dionica II (Bare-Tunel Kobilja Glava-Hotonj; km2+200 do 500+200)	12.307.403		981.291	981.291	981.291	8,0	100,0		7.422.242	3.966.870			
	2	Moderizacija sistema urbanih saobraćajnica u Kanotonu Sarajevo Izgradnjom i rekonstrukcijom IX transverzale	16.133.172	5.914.804	6.040.546	5.690.546	11.605.350	71,9	94,2	5.733.172	3.185.196	7.033.172			
	3	Izgradnja i rekonstrukcija Južne longitudinalne-Dionica II (od IV +200m do X transverzale; km 2+580, 150 do 5+616,20)	15.887.479	10.108.021	5.385.457	5.385.457	15.493.478	97,5	100,0						
	4	Izgradnja i rekonstrukcija VI transvezale-dionica ulica Alije Kučukalića (DZ Kumrovec) do spoja sa ulicom Safeta Zajke	1.841.721		941.721						900.000				
	5	Izgradnja i rekonstrukcija A transverzale	570.427		340.417	340.417	340.417	59,7	100,0		47.666	132.343	50.000		
Ministartvo saobraćaja - Direkcija za ceste KS			46.740.202	16.022.825	13.689.432	12.397.711	28.420.536	60,8	90,6	6.633.172	10.655.104	11.132.385	50.000		
Ministartvo saobraćaja	1	Projekat obnove voznog parka za javni linijski prevoz putnika	56.400.000		32.737.450							23.662.550			
	2	Izgradnja garaže na Babinom dolu - Bjelašnica	1.900.000		1.500.000					400.000					
	3	Projekat izgradnje tramvajskih stajališta za kontrolisanu naplatu	12.164.330		7.115.064							2.524.633	2.524.633		
	4	Javna podzemna garaža G3 u ulici Kolodvorska, Općina Novo Sarajevo	5.500.000		2.000.000					3.500.000					
	5	Adaptivno upravljanje saobraćajem	8.000.000		2.000.000							3.000.000	3.000.000		
	6	Projekat sanacije, rekonstrukcije i modernizacije tramvajske pruge u Sarajevu	46.740.027		83.730	83.730	83.730	0,2	100,0		15.552.099	15.552.099	15.552.099		
	7	Povećanje kapaciteta za prevoz putnika izgradnja tramvajske pruge Ilidža-Hrasnica	17.550.000		2.000.000	118.467	118.467	0,7	5,9	2.000.000	2.000.000	5.800.000	5.750.000		
Ministartvo saobraćaja			148.254.357		47.436.244	202.197	202.197	0,1	0,4	5.900.000	17.552.099	50.539.282	26.826.732		

Podnositelj	R.b	Naziv projekta	Ukupna vrijednost	Utrošeno u prethodnim godinama	Plan za tekuću godinu	Realizovano od 01.01.-31.12.2018.	Ukupno realizovano	Stepen ukupne realizacije u %	Stepen ukupne realizacije u 2018 u %	Nedostajuća sredstva	Plan			Naredni period
											2019	2020	2021	
Ministarstvo za boračka pitanja	1	Izgradnja centralnog spomenika svim poginulim braniteljima opkoljenog Sarajeva	962.000	100.000	50.000		100.000	10,4			150.000	600.000	62.000	
Ministarstvo za boračka pitanja			962.000	100.000	50.000		100.000	10,4			150.000	600.000	62.000	
Ministarstvo za boračka pitanja-Fond memorijala	1	Izrada i postavljanje nišana i spomenika šehidima i poginulim borcima i umrlim braniteljima	8.094.955	5.946.055	310.000	305.350	6.251.405	77,2	98,5		262.700	262.700	262.700	1.050.800
	2	Izgradnja kompleksa "Šehidsko spomen mezarije Kovači"	19.625.452	10.358.805	280.000	160.315	10.519.120	53,6	57,3	3.067.647	417.000	3.417.000	417.000	1.668.000
Ministarstvo za boračka pitanja-Fond memorijala			27.720.407	16.304.860	590.000	465.665	16.770.525	60,5	78,9	3.067.647	679.700	3.679.700	679.700	2.718.800
UKUPNO			644.664.730	182.119.240	142.454.925	62.534.683	244.653.923	38,0	43,9	101.868.854	78.027.548	99.107.067	48.739.132	15.312.963

Tabela 2. Pregled projekata u implementaciji po općinama, u KM

Podnositelj	R.b	Naziv projekta	Ukupna vrijednost	Utrošeno u prethodnim godinama	Plan za tekuću godinu	Realizovano od 01.01.-31.12.2018.	Ukupno realizovano	Stepen ukupne realizacije u %	Stepen ukupne realizacije u 2018 u %	Nedostajuća sredstva	Plan			Naredni period
											2019	2020	2021	
Općina Centar	1	Izgradnja osnovne škole na Šipu	10.500.000	3.037.393	1.100.000	1.100.000	4.137.393	39,4	100,0	1.300.000	1.700.000	1.700.000	1.662.607	
Općina Trnovo	2	Izgradnja regionalnog vodovoda Hojta-Bjelašnica i Igman	4.100.000		4.000.000	2.000.000	2.000.000	48,8	50,0		100.000			
Općina Trnovo	3	Izgradnja Poslovno-sportskog centra Trnovo	10.600.000		4.900.000	4.900.000	4.900.000	46,2	100,0		5.700.000			
Općina Ilijaš	4	Uspostava industrijske zone Luke, Ilijaš	3.193.123		368.241	368.241	368.241	11,5	100,0		1.212.441	1.182.441	430.000	
Općina Ilijaš	5	Izgradnja sistema vodosnabdjevanja MZ Gajevi sa izvorišta Vrutak	1.623.000		466.760	466.760	466.760	28,8	100,0		590.164	283.038	283.038	
Općina Ilijaš	6	Izgradnja puta Alića Rampa-most na rijeci Misoči	459.972		34.236	34.236	34.236	7,4	100,0		425.736			
Općina Ilijaš	7	Revitalizacija Starog Grada Dubrovnika, općina Ilijaš	1.000.000		111.000	111.000	111.000	11,1	100,0		30.000	300.000	559.000	
Ukupno			31.476.095	3.037.393	10.980.237	8.980.237	12.017.630	38,2	81,8	1.300.000	9.758.341	3.465.479	2.934.645	

Projekti koji su u cijelosti završeni u investicionom periodu su:

1. Izgradnja osnovne škole u naselju Aneks
2. Sufinansiranje izgradnje sale za tjelesni odgoj u JU OŠ "Dobroševići"
3. Sufinansiranje izgradnje sale za tjelesni odgoj u JU OŠ "Sedma osnovna škola"
4. Sufinansiranje izgradnje sale za tjelesni odgoj u JU OŠ "Hašim Spahić"
5. Rekonstrukcija doma Kumrovec
6. Izgradnja prostora u CMB_u za smještaj kardiohirurgije, izgradnja terapijskog dijela nuklearne medicine, etaža 04 CMB-a, Izgradnja op bloka sa intezivnom njegovom, etaža 06 i 07 CMB-a, izgradnja oftamološke klinike i klinike za plastičnu hirurgiju na etažama 14 i 15 CMB-a
7. "Energetska - efikasnost" - objekat "Neuro-psihijatrije"
8. Projekat reciklažnog dvorišta u okviru Regionalnog centra za upravljanje otpadom Smiljevići
9. Unapredjenje deponovanja komunalnog otpada u okviru RCUO-Smiljevići
10. Izgradnja Kotlovnice snage 20 MW na lokalitetu obuhvata regulacionog plana "Allipašin most VII" (kotlovnica Alipašin most-1)
11. Izgradnja sistema za vještačku proizvodnju snijega i novi vertikalni transport na Bjelašnici


2. Projekti prema strukturi i načinu finansiranja

Od ukupne realizacije projekata 256.671.553 KM realizovano je domaćih sredstava 204.320.589 KM (80,0%), a ino sredstava 52.350.964 (20,0%).

Tabela 3. Pregled ulaganja u projekte u implementaciji po strukturi finansiranja, u KM


Vrsta	Izvor finansiranja	Ukupna vrijednost	Utrošeno u prethodnim godinama	Plan za tekuću godinu	Realizovano od 01.01.-31.12.2018.	Ukupno realizovano	Nedostajuća sredstva	Plan			Naredni period
								2019	2020	2021	
Ino	Grant	34.594.701	1.071.618	725.286	684.183	1.755.801	32.797.797				
	Donacija	3.156.423	3.156.423			3.156.423					
	IP Fond	24.060.000					24.060.000				
	Kredit	212.051.720	31.572.930	65.904.820	15.865.810	47.438.740	18.080.000	29.154.704	50.680.128	16.265.137	
Ukupno ino		273.862.844	35.800.971	66.630.106	16.549.993	52.350.964	74.937.797	29.154.704	50.680.128	16.265.137	
Domaća	Budžet	327.102.073	107.424.666	74.969.841	49.138.802	156.563.468	26.021.051	48.242.135	48.401.918	32.418.140	12.350.963
	Kredit	41.505.846	23.550.200	6.982.841	2.180.150	25.730.350		7.472.805	1.500.000	2.000.000	
	Grant	5.757.431	4.891.387	341.044	336.044	5.227.431		75.000	75.000	75.000	300.000
	Transfer	128.432	98.432	30.000	30.000	128.432					
	Vlastiti prihodi	18.886.673	9.749.801	2.824.980	2.163.841	11.913.642	877.647	1.441.245	1.015.500	715.500	2.262.000
	Primitak	308.663	140.063	168.600	101.000	241.063					
	Kirija	1.501.484	1.028.824	472.660		1.028.824					
	Donacija	1.320.000	620.000			620.000		700.000			
	Namjenska sredstva FZO	4.618.210	1.684.648	833.562	833.562	2.518.210	700.000	700.000	700.000		
Sredstva fonda	1.149.169	167.641	181.528	181.528	349.169	632.359		200.000	200.000	400.000	
Ukupno domaća		402.277.981	149.355.662	86.805.056	54.964.927	204.320.589	28.231.057	58.631.185	51.892.418	35.408.640	15.312.963
Ukupno tekući projekti		676.140.825	185.156.633	153.435.162	71.514.920	256.671.553	103.168.854	87.785.889	102.572.546	51.673.777	15.312.963

Učešće domaćih i ino sredstava u ukupnoj realizaciji

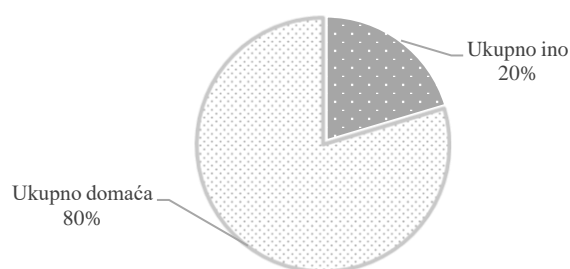

Graf 1.

Učešće domaćih i ino sredstava u realizaciji u 2018. godini

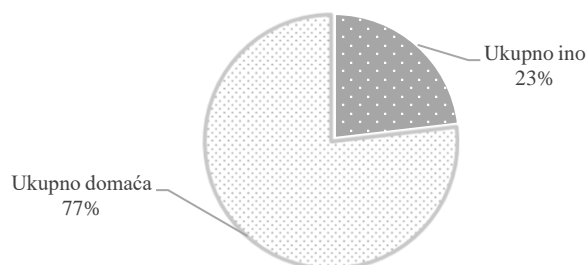

Graf 2.

U 2018. godini od ukupne realizacije projekata 71.514.920. KM realizovano je domaćih sredstava 54.964.927 KM (77,0%) i ino sredstava 16.549.993 KM (23,0%).

Zaključak

Od vrijednosti projekata u implementaciji 676.140.825 KM u investicionom periodu realizovano je 256.671.553 KM ili 37,9%.

Za 2018. godinu planirana je realizacija u vrijednosti od 153.435.162 KM projekata u implementaciji, od čega je na dan 31.12.2018. godine realizovano 71.514.920 KM ili 46,6%.

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša ima najveći stepen realizacije projekata u investicionom periodu, gdje je od 65.351.170 KM realizovano 51.599.714 KM ili 79,0%. No, od planirane vrijednosti za 2018. godinu 10.061.318 KM, a na dan 31.12.2018. godine realizovano svega 6.289.862 KM ili 62,5%.

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade KS bilježe najveći iznos realizacije na dan 31.12.2018. godine 8.514.256 KM ili 98,8% od planirane vrijednosti za 2018. godinu u iznosu od 8.414.256 KM, pa Direkcije za puteve KS 13.689.432 KM ili 90,6% od planirane vrijednosti za 2018. godinu u iznosu od 12.397.711 KM.

Projekti koji su u cjelosti završeni u investicionom periodu su:

1. Izgradnja osnovne škole u naselju Aneks
2. Sufinansiranje izgradnje sale za tjelesni odgoj u JU OŠ "Dobroševići"
3. Sufinansiranje izgradnje sale za tjelesni odgoj u JU OŠ "Sedma osnovna škola"
4. Sufinansiranje izgradnje sale za tjelesni odgoj u JU OŠ "Hašim Spahić"
5. Rekonstrukcija doma Kumrovec
6. Izgradnja prostora u CMB_u za smještaj kardiohirurgije, izgradnja terapijskog dijela nuklearne medicine, etaža 04 CMB-a, Izgradnja op bloka sa intezivnom njegom, etaža 06 i 07 CMB-a, izgradnja oftamološke klinike i klinike za plastičnu hirurgiju na etažama 14 i 15 CMB-a
7. "Energetska - efikasnost" - objekat "Neuro-psihiatrije"
8. Projekat reciklažnog dvorišta u okviru Regionalnog centra za upravljanje otpadom Smiljevići
9. Unapredjenje deponovanja komunalnog otpada u okviru RCUO-Smiljevići
10. Izgradnja Kotlovnice snage 20 MW na lokalitetu obuhvata regulacionog plana "Allipašin most VII" (kotlovnica Alipašin most-1)
11. Izgradnja sistema za vještačku proizvodnju snijega i novi vertikalni transport na Bjelašnici

Iz Ministarstva saobraćaja postoje projekti koji nisu realizovani u investicionom periodu. To su sledeći projekti:

1. Izgradnja i rekonstrukcija VI transvezale-dionica ulica Alije Kučukalića (DZ Kumrovec) do spoja sa ulicom Safeta Zajke
2. Projekat obnove voznog parka za javni linijski prevoz putnika. Nakon angažovanja konsultanata od strane EBRD trebalo bi se početi sa pripremom tenderske dokumentacije i pokretanje postupka javne nabavke. Očekuje se da će se postupak javne nabavke pokrenuti u mjesecu maju 2019. godine. Nabavka trolejbusa se očekuje do kraja septembra 2019.

godine, a nabavka tramvaja do kraja marta 2020. godine. Puštanje tramvaja u saobraćaj će zavisiti od brzine modernizacije tramvajske pruge kako bi novi tramvaji bili uključeni u saobraćaj po novoj pruzi. Nabavka novih minibusa u vrijednosti 2.700.000,00 KM – tender u toku koji provodi Gras.

3. Izgradnja garaže na Babinom dolu-Bjelašnica
4. Projekat izgradnje tramvajskih stajališta za kontrolisanu naplatu. Ukupna vrijednost 10.500.000,00 KM. Plan za tekuću godinu 8.500.000,00 KM – tender u toku ministarstvo provodi. 2019-2020 još 2.000.000,00 KM. Planirano je da I Faza bude realizovana do kraja septembra 2019., a II i III Faza budu realizovane u 2020. i 2021. godini.
5. Javna podzemna garaža G3 u ulici Kolodvorska, Općina Novo Sarajevo. Za ovaj projekat izdvojeno je 2.000.000,00 KM, (prenesena sredstva iz 2018. u 2019.) i o projektu će se Ministarstvo naknadno izjasniti.
6. Adaptivno upravljanje saobraćajem (prethodni naziv projekta-Automatsko upravljanje semaforiskim sistemom). Za ovaj projekat planirana sredstva u iznosu od 8.000.000,00 KM. Planirana sredstva u 2018. godini u iznosu od 2.000.000,00 KM za prvu fazu radova nisu utrošena i prenose se na 2019. godinu. Po 3.000.000,00 će biti planirana sredstva u 2020. i 2021. godini.

Osim toga, projekti koji nisu počeli sa realizacijom su:

1. Izgradnja osnovne škole u MZ Stup
2. Izgradnja i opremanje zgrade Odjeljenja za forenzičku psihijatriju pri JU Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo, (prenesena sredstva u 2019. godinu)
3. Proizvodnja i primjena novih energenata,
4. Rekonstrukcija startnog objekta na vrhu Bjelašnice,
5. Studija za smanjenje neoprihodovane vode u KS,
6. Sanacija prioriternih dijelova vodovodnog sistema-I tranša kredita EBRD
7. Dogradnja i adaptacija IV policijske uprave MUP-a KS, PS Novi Grad,

Posebno treba istaći da je implementacija mnogih projekata vezana za zahtjevne procedure javnih nabavki. Praktično takvi projekti nemaju finansijsku realizaciju, ali su se počeli implementirati.

Od ukupne realizacije projekata 256.671.553 KM realizovano je domaćih sredstava 204.320.589 KM (80,0%), a ino sredstava 52.350.964 (20,0%).
